

AYDINCIK İLÇESİ YATIRIM KİTAPÇIĞI (2002-2017)



GENEL BİLGİLER

1987 yılında İlçe olan Aydıncık'ın 15 mahallesi bulunmaktadır. 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kayıtlarına göre Aydıncık'ın toplam nüfusu 11.101'dir.





TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Aydıncık Kamaş İlköğretim Okulu	Eğitim	2003-2003	200.149	14 Derslik
Aydıncık Atatürk İlköğretim Okulu	Eğitim	2007-2007	112.686	2 Derslik
Aydıncık Fatih İlköğretim Okulu	Eğitim	2009-2009	186.082	5 Derslik
Aydıncık Cumhuriyet İlköğretim Okulu	Eğitim	2011-2011	813.020	14 Derslik
Aydıncık Anaokulu	Eğitim	2012-2012	541.266	4 Derslik



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Aynalıgöl Mağarası	Kültür Turizm	2011-2011	363.010	Turizm



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Hacıbahattin Mah. Futbol Sahası ve Tesis Yapımı	Gençlik ve Spor	2016-2016	1.000.000	Saha

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Aydıncık Bld.Koruma Amaçlı İmar Planı Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri-Yikob	2014-2014	80.750	Tescilli Kültür Varlığı
Bld. Kelenderis Antik Kenti Liman Blg. Yarımada Arkeopark Proje İşi	Diğer Kamu Hizmetleri-Yikob	2014-2014	154.057	Tescilli Kültür Varlığı
Kelenderis Kent Parkı Çevre Düzenleme Projesi Hazırlaması İşi	Diğer Kamu Hizmetleri-Yikob	2014-2014	388.742	Tescilli Kültür Varlığı
Kelenderis Doğu Nekropolü Çevre Düzenleme Projesi Hazırlanması İşi	Diğer Kamu Hizmetleri-Yikob	2014-2014	277.403	Tescilli Kültür Varlığı
Merkez Mahallesi Baloğlu Konağı Kamulaştırma İşi	Diğer Kamu Hizmetleri-Yikob	2014-2016	298.205	Tescilli Kültür Varlığı
Aydıncık Merkez Mahallesi Baloğlu Konağı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Ve Peyzaj Projelerinin Hazırlanması İşi	Diğer Kamu Hizmetleri-Yikob	2016-2016	197.556	Tescilli Kültür Varlığı
200 Kişilik Öğrenci Pansiyonu	Eğitim-Yikob	2016-2017	5.349.124 TL	200 Kişilik



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Aydıncık Balıkçı Barınağı Hasar Onarımı	Ulaştırma	2013-2013	238.360	Bakım Onarım
Aydıncık Yat Limanı Etüt-Proje İşyeri	Ulaştırma	2015-2015	335.710	Etüt-Proje



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Aydıncık Orman Bölge Çalışmaları	Orman	2010-2016	2.825.140	Orman Koruma
Yol Yapım İşi	Orman	2017-2017	2.142.700 TL	Büyük Onarım, Yol Yapım İşi (14 proje)



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
I. Kısım İçmesuyu	İlbank	2007-2008	1.108.894	3 Adet Depo+2 Adet Erfi Merkezi



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Dere Islahları	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2010-2014	21.210.000	10 Taşkın Koruma
PTT Bina Tadilatları	Diğer Kamu Hizmetleri	2012-2012	184.660	PTT Bank Konsept
Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası	Diğer Kamu Hizmetleri	2013-2014	1.188.850	Yapım İşi
Milli Park-Doğa Koruma Çalışmaları	Diğer Kamu Hizmetleri	2008-2016	730.714	Doğa Koruma ve Milli Parklar
1. Kat Asfalt Sathi Kaplama	Diğer Kamu Hizmetleri-Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	1.909.712	Asfalt Kaplama
2.Kat Asfalt Sathi Kaplama	Diğer Kamu Hizmetleri-Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	29.500	Asfalt Kaplama
Sıcak Asfalt Yapımı	Diğer Kamu Hizmetleri-Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	5.452.488	Asfalt Yapımı
Melisa Üretimini Teşvik ve Yaygınlaştırma Projesi	Diğer Kamu Hizmetleri-Büyükşehir Belediyesi	2016- 2016	19.168	Proje Uygulaması

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/DSİ

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Mersin-Aydıncık Göleti ve Sulaması	Aydıncık	2014-2017	13.646.061	9.984.103	3	-	-	75	Toplam 593804 M3 Gölet Dolgusunun 427804 M3'ü Yapılmış, 166000 M3 Kalmıştır. Kret Kotu 110 Mt Olup Gövde Dolgusu 96 Mt Kotundadır. Sifon Yapısı, Dolusavak İmalatındaki Artış, Enjeksiyon İşleri, Ölçüm Aletleri Ve Karayolu Deplasesinden Ötürü %30 Keşif Artışı Öngörülmektedir. İşin Parasal Gerçekleşme Oranı %75 Tir. Patlatma Ruhsatının Süresinin Uzatılması İçin Emniyete Başvurulmuş Olup Süreç Devam Etmektedir.
Mersin-Aydıncık Göleti Sulaması	Aydıncık	2017-2018	2.500.000	-	-	-	-	-	İhalesinin 2017 Yılı Eylül Ayında Yapılması Planlanmaktadır.

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/EĞİTİM

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Anadolu Lisesi	Hacıbahattin Mah.	2017-2018	2.808.400	-	-	-	0	1	Devam Etmektedir.



DEVAM EDEN YATIRIMLAR/İLBANK

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Aydıncık Belediye Hizmet Binası	Aydıncık	2016-2017	3.177.000	849.163	2.327.837	1.853.345	80	84	Çalışmalar Devam Etmektedir.
Aydıncık Kanalizasyon İnşaatı	Aydıncık	2014-2016	10.538.000	8.000.000	-	-	-	89	TM Terfi Merkezi Yerinin Kamulaştırma İşlemleri İle İlgili Hukuki Süreç Beklenmektedir.


DEVAM EDEN YATIRIMLAR/KARAYOLLARI (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Antalya Hd.- Anamur- Silifke- Mersin Aksı	Erdemli Silifke Aydıncık Bozyazı Anamur	1985-2020	3.600.000.000	1.378.000.000	64.250.000	105.680.000	41	57	<p>Toplam 227 Km Uzunluğunda Olup Proje Bünyesinde 27 Adet Tünel (31.043 M), 17 Adet Viyadük (6.165 M) Ve 6 Adet Köprü (372 M) Yer Almaktadır.</p> <p>Bugüne Kadar 191,2 Km By (90,9 Km By-bsk, 100,3 By-sk), 5 Adet Köprü (308 M) Ve 10 Adet Tünel (7.472 M) Tamamlanmış Olup 9 Adet Tünel (6.971 M) İle 1 Adet Viyadük (140 M) Tamamlanmış Ve Trafiğe Açılmıştır. 11 Kesimde Yapım Çalışmaları, 2 Kesimde İhale Süreci Devam Etmekte Ve Bir Kesimde Proje Çalışmaları Devam Etmektedir. Proje Tamamlandığında Yol 33 Km Kısalmaktadır.</p>



DEVAM EDEN YATIRIMLAR/KARAYOLLARI (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
(Silifke-Mut) Ayr -Gülнар- Aydıncık Yolu (Gülнар-Aydıncık Arası)	Gülнар Aydıncık	2014-2018	93.500.000	29.980.000	-	9.500.000	42	47	Toplam 30,8 Km (6 Km BY, 24,8 TY) Uzunluğundaki Yolu Tamamı BSK Olarak Yapılacaktır. Çalışmalar Devam Etmektedir. Ayrıca Proje Güzergahında 560 M Uzunluğunda Menekşe Viyadüğü (Konsol Viyadük) Bulunmaktadır. Proje İhalesi Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı Bünyesinde Yapılmış Olup Proje Çalışmalarına Başlanmıştır.

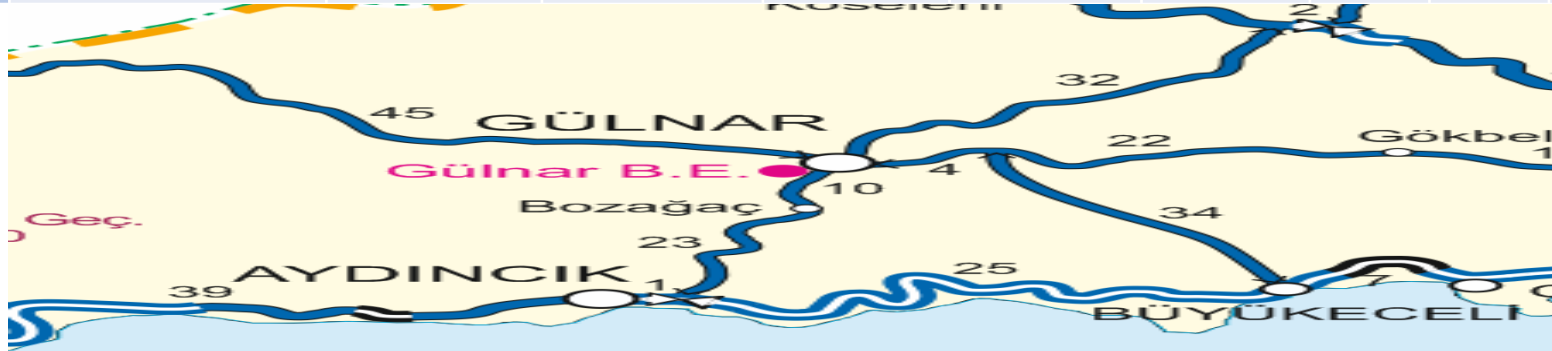

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/ÜNİVERSİTE (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Derslik ve Merkezi Birimler	Yenişehir Erdemli Aydınck	1994-2020	150.000.000	134.000.000	16.000.000	11.558.545	97	-	

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/YİKOB

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası	Aydıncık	2016-2018	2.648.000	499.882	3.864.591	808.601	73	80	Bina Kaba İnşaatı, Ahşap Oturtma Çatı Ve Kaplaması, Döşeme Kaplamaları, Wc Duvar Kaplamaları, Sıva Ve Çevre Duvarı İmalatları Tamamlandı. Giydirme Alüminyum Cephe Kaplaması Ve Mekanik Sistem Traverten Cephe Kaplaması İmalatları Devam Etmektedir.



PLANLANAN YATIRIMLAR/DSİ

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Mersin İli Bozyazı ve Aydıncık Gilindire Sulaması Rehabilitasyonu	Aydıncık	2018-2021	30.000.000	Planlama Ve Proje Yapım Çalışmaları Devam Etmektedir.
Mersin-Aydıncık Karadere Göleti ve Sulaması	Aydıncık	2018-2020	10.500.000	Planlama Ve Proje Yapım Çalışmaları Devam Etmektedir.
Mersin-Aydıncık Kızılyokuş Göleti	Aydıncık	2018-2020	12.000.000	Planlama Ve Proje Yapım Çalışmaları Devam Etmektedir.



PLANLANAN YATIRIMLAR/AYDINCIK KAYMAKAMLIĞI

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Pembecik Değirmendere Islahı	Aydıncık	2018-2020		DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 3. Kısım Taşkın Ve Rusubat Kontrolü İstikşaf Raporu Yapım İşi Kapsamında Ele Alınacak Olup Rapor Çalışmalarının Tamamlanmasının Akabinde Yatırım Programına Teklif Edilerek Islahı Yapılabilecektir.



PLANLANAN YATIRIMLAR/TEİAŞ

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Akkuyu 380 TM	Aydıncık	2018-2021	48.000.000	2017 Yılı Etütlerde Yer almaktadır. Çalışmalar devam etmektedir.
Akkuyu NGS – Manavgat 380 EİH (TTFO)	Aydıncık	2018-2021	79.000.000	2017 Yılı Etütlerde Yer almaktadır. Çalışmalar devam etmektedir.
Akkuyu NGS-Akkuyu 380 EİH (TTFO)	Aydıncık	2018-2021	8.000.000	2017 Yılı Etütlerde Yer almaktadır. Çalışmalar devam etmektedir.



PLANLANAN YATIRIMLAR/TEİİAŞ (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Taşucu-Anamur EİH Yenileme	Silifke-Aydıncık-Bozyazı- Anamur (Taşucu TM ile Anamur TM arasındaki enerji iletim hattıdır.)	2018-2021	20.000.000	2018 Yılı Yatırım Programına Teklif Edildi.
Akkuyu NGS-Ereğli 380 EİH (KOP) (TTFO)	Aydıncık Gülнар	2018-2021	73.000.000	2017 Yılı Etütlerde Yer almaktadır. Çalışmalar Devam Etmektedir.



PLANLANAN YATIRIMLAR/ULAŞTIRMA

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Aydıncık Yat Limanı	Aydıncık	2018-2020	63.720.000	Etüt Proje Çalışmaları Devam Etmektedir.

PLANLANAN YATIRIMLAR/YİKOB (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Kırsal Altyapı Destek 2. Bölge Yapım İşi	Anamur/Gercebahşiş Aydıncık/Yenikaş Bozyazı/Kömürlü Gülнар/Kızılca Mut/Arıkuyusu Silifke/Yalnızcabağ Silifke/Sarıaydın			1. Etap Kendi İçerisinde 1. Bölge Ve 2. Bölge Olarak Ayrılmıştır. 2. Bölge 21.08.2017 Tarihinde Saat 14:00'da İhalesi Yapıldı
